

PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA 2011

SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE

INVERSION PUBLICA AÑO 2011


PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE
POR DISTRITOS

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DISTRITO	PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
	Nuevos Soles	Porcentaje	Nuevos Soles	Avance %
CALLAO	35,386,807.00	23.0	29,126,795.00	82.3
BELLAVISTA	21,190,780.00	13.7	11,867,049.00	56.0
CARMEN DE LA LEGUA	3,123,729.00	2.0	2,475,069.00	79.2
LA PERLA	8,193,494.00	5.3	-	-
LA PUNTA	-	-	-	-
VENTANILLA	43,772,272.00	28.4	28,293,439.00	64.6
MULTIDISTRITAL	42,490,137.00	27.6	39,897,618.00	93.9
TOTAL	154,157,219.00	100.0	111,659,970.00	72.4



**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011
POR DISTRITOS (%)**

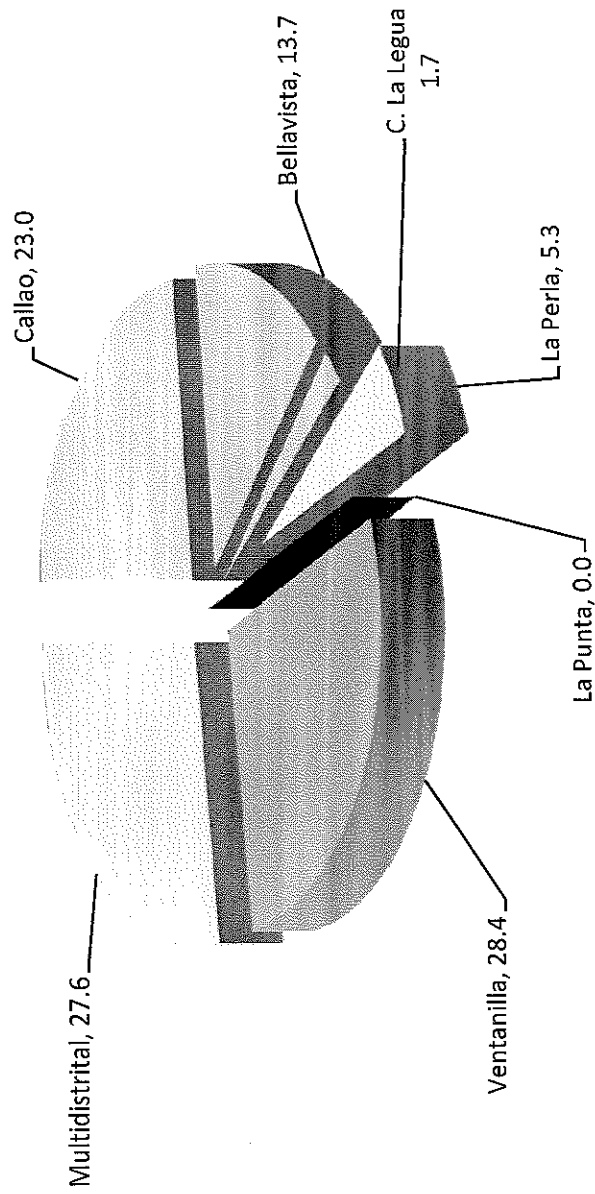

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011 POR
DISTritos AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE**

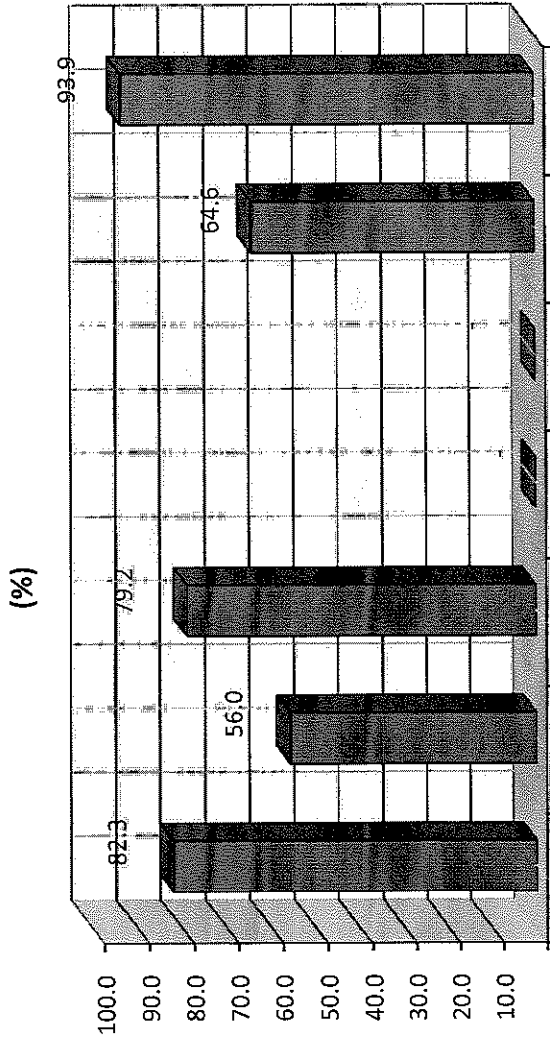

%



INVERSION PUBLICA AÑO 2011

PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE
POR ORGANO EJECUTOR


PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

ORGANO EJECUTOR	PRESUPUESTO MODIFICADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	
	Nuevos Soles	Porcentaje	Nuevos Soles	Avance %
. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	134,357,912.00	87.2	96,539,225.00	71.9
. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,152,565.00	1.4	2,152,561.00	100.0
. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2,308,397.00	1.5	613,503.00	26.6
. CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL FONDO EDUCATIVO	2,158,034.00	1.4	707,619.00	32.8
. GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	3,927,452.00	2.5	3,219,318.00	82.0
. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,158,558.00	0.8	1,109,898.00	95.8
. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,390,789.00	0.9	1,329,288.00	95.6
. HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	3,870,517.00	2.5	3,534,220.00	91.3
. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE	2,164,861.00	1.4	1,786,205.00	82.5
. VARIOS	668,134.00	0.4	668,133.00	100.0
TOTAL	154,157,219.00	100.0	111,659,970.0	72.4




PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2011 POR ORGANO EJECUTOR

(%)

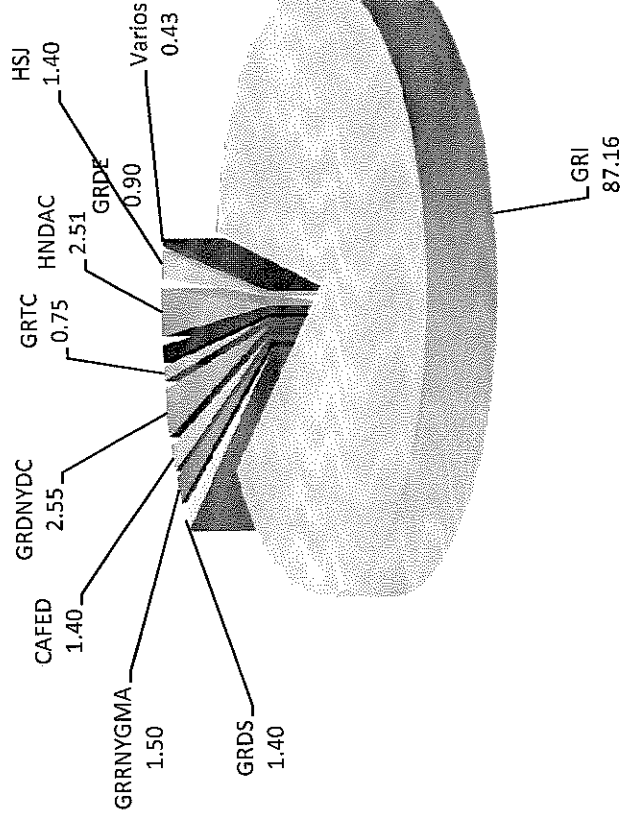


**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2011
 POR ORGANO EJECUTOR
 AVANCE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE
 %**

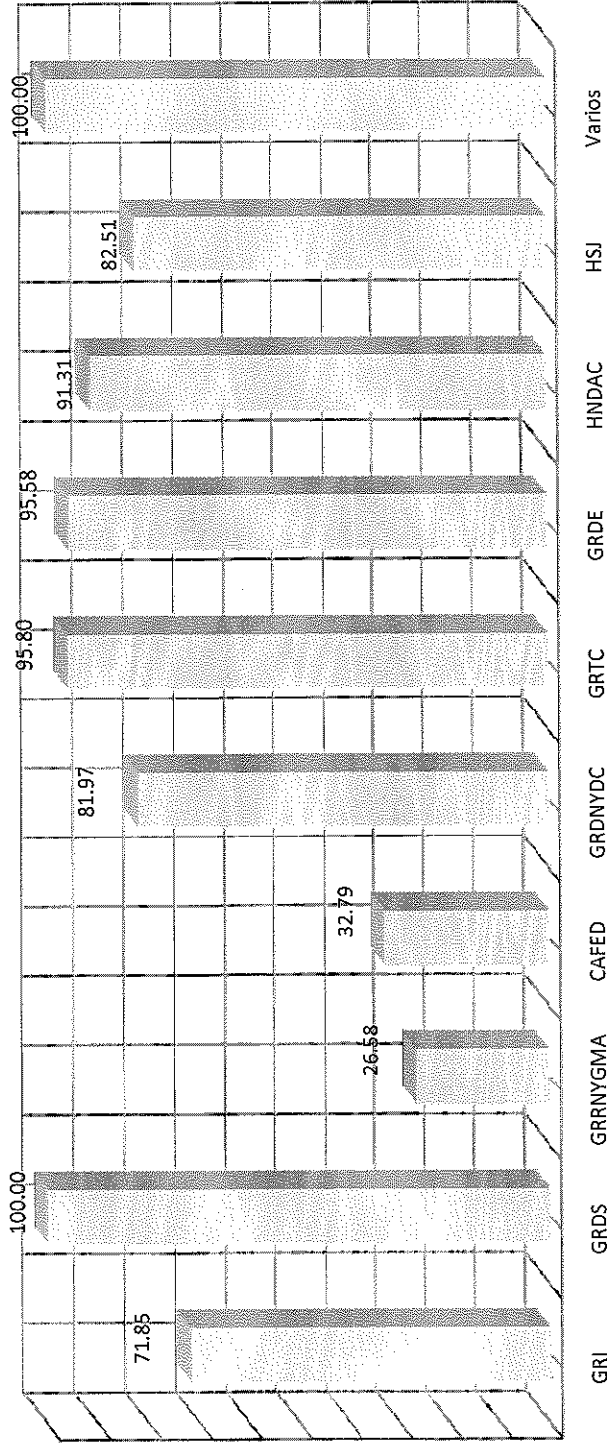

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 064 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION			72,708,702	24,828,248	37,526,204	22,835,663.00	60.9	57,345,843.88	78.9		
1.	2979	036824	Construcción e implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Ojaya Belandrá	GRC-GRI	Ventania	8,021,027	1,444,685	1,444,685	1,368,405.00	94.7	9,574,179.87	119.4	Obra concluida el 30-06-2011. Recepcionada. En Liquidación	
2.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventania	GRC-GRI	Ventania	2,661,392	3,495	3,495	-	-	2,663,852.61	95.2	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	
3.	10412	018519	Ampliación de la I.E. N° 135 MI Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,913	3,530	3,530	-	-	450,642.00	100.8	Obra concluida y liquidada.	
4.	10280	018596	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventania, Callao	GRC-GRI	Ventania	1,810,229	1,507,998	1,507,998	1,422,978.00	94.4	2,830,736.39	156.4	Obra concluida, en liquidación.	
5.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventania	GRC-GRI	Ventania	1,136,506	212,842	212,842	9,111.00	4.3	1,195,147.17	105.2	Obra terminada con acta de recepción de obra, en proceso de liquidación.	
6.	21872	086683	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventania	GRC-GRI	Ventania	3,261,037	3,389,527	3,389,527	3,185,485.00	94.0	3,261,901.50	100.0	Obra en ejecución. Contrato Firmado 06-06-2011.	
7.	22277	026586	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventania	GRC-GRI	Ventania	2,028,374	422,410	422,410	421,376.00	99.8	2,074,495.46	102.3	Obra concluida.	
8.	22251	026580	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balmeario, Pachacutec - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	1,201,429	45,053	45,053	34,792.00	77.2	53,770.00	4.5	Expediente Técnico concluido.	
9.	22460	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Balaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrón - Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360	10,725	10,725	-	-	2,221,855.60	95.8	Obra concluida y liquidada.	
10. (***)	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventania-Callao	GRC-GRI	Ventania	4,920,389	4,845,447	4,845,447	-	-	79,205.00	1.6	En ejecución. Obra por impuestos.	
11.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventania	GRC-GRI	Ventania	3,192,306	3,081,735.00	3,142,708	3,128,022	99.5	3,181,293.00	99.7	Obra terminada. En proceso de liquidación.	
12.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventania	GRC-GRI	Ventania	6,114,896	5,690,160	5,076,601	2,223,475.00	43.8	2,279,156.00	37.3	Obra en ejecución.	
13.	23830	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	556,026	12,152	12,152	3,455.00	28.5	567,320.58	101.7	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación.	
14.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	1,739,455	1,763,689	1,763,689	1,763,687.00	100.0	1,841,271.00	105.9	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación.	
15.	24196	026593	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventania	GRC-GRI	Ventania	2,548,597	791,440	791,440	758,686.00	95.9	2,587,905.00	101.5	Obra Concluida y Recepcionada el 01-04-2011, se entrega la obra a la UGEL Ventania. Pendiente de Liquidación de obra.	
16.	24748	026897	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec	GRC-GRI	Ventania	2,662,685	1,506,196	1,506,196	1,470,888.00	97.7	1,508,108.00	96.6	Con Buena Pro consentida. Firma de contrato.	
17. (*)	24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventania	GRC-GRI	Ventania	2,976,349	596,532	596,532	524,057.00	89.5	3,441,141.00	115.6	Obra terminada. Falta informe.	
18.	24902	026591	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	815,000	162,484	162,484	23,508.00	15.4	36,331.00	4.5	Expediente técnico en elaboración. Se esta revisando los costos y presupuestos en la Of. De Construcción.	
19.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	9,178,369	211,238.00	8,986,670	3,045,526.00	33.9	3,271,164.00	35.6	Obra en ejecución.	
20.	132259	109818	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmóvion - Pachacutec - Ventania	GRC-GRI	Ventania	3,691,425	3,464,590	3,464,590	3,333,220.00	96.2	3,412,778.70	92.5	Obra en ejecución.	
		018545	Sustitución y Ampliación del C.N. N° 5124 en el AA.HH. Hiroshima - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	3,301,075	39,979	39,979	39,772.00	99.5	3,428,648.00	103.9	Obra Liquidada.	
		026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventania - Callao	GRC-GRI	Ventania	3,803,565	89,735	89,735	79,317.00	88.4	3,907,463.00	102.7	Obra Liquidada.	



SECRETARÍA REGIONAL DEL CALLAO
 V.º B.º
 OS
 ZAPAREDES
 BRAVO
 DRPI

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

RIJCO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



N°	Cód. SNI	Cód. DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
23.	23315	028570	Ampliación de la institución Educativa N° 2093 - Santa Rosa - Carro La Regia - Callao	GRC-GRI	Callao	994,632	991,000.00	87,804	-	-	-	-	-	PIP cerrado. Nuevo perfil viable.
24.	23980	028576	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec - Ventanilla Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,306,656	-	-	-	3,697,479.00	108.5	100.0	100.0	Obra Liquidada.
			CULTURA Y DEPORTE			13,727,721.50	10,051,489.00	8,584,885.00	85.4	8,584,885.00	62.5			
25	172947	132601	Mejoramiento de la infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de La Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,830,393	4,613,418	4,613,418	100.0	4,613,417.00	79.1	100.0	100.0	Obra concluida. Concurso Exo. N° 9-2011-RC.
26	173910	132945	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada entre el A.A.H.H. Andrés Bello Cáceres y el A.A.H.H. San Antonio, Margen Derecha de la Av. Morales Duarte, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	198,837	198,836	198,836	100.0	198,837.00	100.0	100.0	100.0	Obra concluida.
27.	173914	133614	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque de Los Pozos - Ciudad Satélite Santa Rosa - Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	163,724	163,724	163,723.00	100.0	163,723.00	100.0	100.0	100.0	Obra concluida.
28	182769	143781	Mejoramiento de Losa Deportiva con Grass Artificial y Tribunas en el Parque N° 31 del A.H. Angamos III Sector, Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	190,880	190,249	190,249.00	100.0	190,249.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
29	188629	146604	Mejoramiento de la Cancha de Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales bermudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	GRC-GRI	Callao	729,506	-	-	-	-	97.4	-	-	Concurso desierto.
30.	189030	146591	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la LE. N° 5048-Ramón Castilla Marquesado - callao	GRC-CAFED	Callao	206,046	12,000	6,000.00	50.0	6,000.00	97.4	-	-	Expediente en elaboración.
31.	184620	146592	Creación de Losa Deportiva Ubicada en la Institución Educativa Pública Callao - Bellavista-Callao	GRC-CAFED	Callao	285,423	247,835	247,835.00	100.0	247,835.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
32.	187424	146239	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el C.E. PNP Juan Inguaza Valdivia -Callao-Callao	GRC-CAFED	Callao	232,794	233,310	233,306.00	100.0	233,306.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
33.	173902	133601	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Parque Felicidad - Bocanegra V Sector, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	178,964	161,662	161,661.00	100.0	161,661.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
34.	173915	133600	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Los Pilares - Bocanegra V Sector, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	190,962	205,369	205,368.00	100.0	205,368.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
35	178253	134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	GRC-GRI	Bellavista	2,087,485	1,463,795	1,447,613.00	98.9	1,447,613.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
36.	184983	145434	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Manuel Raygada, Urb. 2 de Julio - Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Callao	185,929	213,023	213,023.00	100.0	213,023.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
37.	184980	145433	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Mario Polar Ugarteche, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Callao	208,862	204,863	204,862.00	100.0	204,862.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
38.	184586	145435	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Delgado Parker, Urb. Delgado Parker - Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Callao	221,922	215,647	215,646.00	100.0	215,646.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
39.	184682	146580	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Olimpico, Urb. Juan Pablo II - Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Callao	216,115	210,437	210,437.00	100.0	210,437.00	97.4	100.0	100.0	Obra concluida.
40.	185043	145529	Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamonte - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	159,793	10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	97.4	-	-	En elaboración de Expediente técnico
41.	180390	146602	Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. A Lote 03 del A.H. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	182,973	10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	97.4	-	-	En elaboración de Expediente técnico
			Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en el Lote PQ1 del A.H. San Pablo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	198,506	10,600	10,500.00	100.0	10,500.00	97.4	-	-	En elaboración de Expediente técnico



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. S/NP	Cód. D/NP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % Z/	ESTADO DE SITUACIÓN Z/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
43.	189094	146903	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. F. lote 15 del A.H. El Gofio, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	236,463		10,500.00	10,500.00	100.0	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
44.	189091	147376	Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada en la Mza. M. lote 01 del A.H. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	193,390		10,500.00	10,500.00	100.0	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
45.	189097	147495	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL I.E. 5078 NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO-CALLAO	GRC-CAFED	Callao	229,865	229,865	6,200.00	6,200.00	2.7	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
46.	189243	147496	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-CAFED	C. La Legua	190,770	189,361	189,285.00	189,285.00	100.0	97.4	100.0	Obra concluida	
47.	191481	147497	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO	GRC-CAFED	C. La Legua	271,582	276,128	6,200.00	6,200.00	2.2	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
48.	189798	147831	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. POLITECNICO REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO - CALLAO	GRC-CAFED	Callao	232,789	232,459	6,200.00	6,200.00	2.7	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
49.	183452	148531	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA - CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	272,825	272,197	6,700.00	6,700.00	2.5	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
50.	198103	148532	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5033 - 200 MILLAS - CALLAO - CALLAO	GRC-CAFED	Callao	247,518	271,555	5,890.00	5,890.00	2.2	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
51.	195181	149520	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	193,493	193,494	-	-	-	97.4	-	En elaboración de Expediente técnico	
52.	10431	017714	SAIUD Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039	23,919,838.00	9,730,185.00	48,793,751.21	40.7	76.6	100.0	Obra concluida y liquidada.	
53.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,566,593	357,697	354,915.00	1,365,929.06	99.2	87.2	100.0	Obra culminada en proceso de recepción de obra.	
54.	28553	028746	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procesamientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,503,569	1,579,511	1,207,576.00	5,319,127.00	76.5	118.1	94.0	En ejecución con retraso, tiene un avance físico de 94% y financiero de 100%.	
55.	30796	046588	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cucha, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	2,521,563	585,350	578,629.00	2,813,411.00	99.9	111.6	83.9	En ejecución con retraso, tiene un avance físico de 73% y financiero de 78.64%.	
56.	80730	044665	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	GRC-OTIC	Callao	5,452,572	-	-	4,727,055.16	-	86.7	100.0	Proyecto Concluido. En proceso de liquidación	
57.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Ventanilla	12,506,880	2,162,565	2,152,561.00	12,430,935.00	100.0	99.4	100.0	Concluido, instalación de módulos.	
58.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-GRI	Bellavista	6,062,366	748,362	346,597.00	5,295,400.00	46.3	87.3	60.0	Expediente de saldo de obra culminado.	
59. (*)	111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonifas-DISA I-Región Callao	GRC-GRI	Callao	5,157,235	1,787	1,767.00	4,846,390.00	100.0	94.0	100.0	Obra Liquidada, con saldo a favor del contratista.	
60.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Distal I - Región Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856	5,274,305	738,615.00	741,615.00	14.0	14.1	4.0	Obra en ejecución con contrato firmado.	
081444			Reconstrucción y Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta Gambaite Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	4,203,624	814,166.00	882,026.00	19.4	20.9	-	En proceso de convocatoria.	
092524			Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	5,131,274.00	-	3,500.00	-	0.1	-	PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio N° 074-2010-GRC/GGR-ORPI de fecha: 21/09/2010. La actualización del perfil esta a cargo de la GR de Salud.	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 064. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
63. (*)	119247	076255	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233		1,212	1,138.00	93.9	4,204,327.00	92.5	100.0	Otra concluida y liquidada.
64. (****)	84305	076224	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrón	GRC-HNDAC	Bellavista	989,209		989,209	933,272.00	94.3	933,272.00	94.3	100.0	Otra concluida.
65. (****)	77382	076256	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrón	GRC-HNDAC	Bellavista	125,209		125,209	122,608.00	97.9	122,608.00	97.9	100.0	Otra concluida.
66. (****)	101082	115603	Implementación del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la TBC en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón	GRC-HNDAC	Bellavista	975,506		975,506	975,506.00	100.0	975,506.00	100.0	100.0	Otra concluida.
67. (****)	144059	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	380,895		380,895	377,957.00	99.2	377,957.00	99.2	100.0	Otra concluida.
68. (****)	140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	288,973		288,973	233,414.00	80.8	233,414.00	80.8	100.0	Otra concluida.
69. (****)	142638	115796	Mejora de la Capacitación Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	1,005,682		1,005,682	795,263.00	79.1	795,263.00	79.1	100.0	Otra concluida.
70. (****)	169509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Psiquiátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	105,143		105,143	96,210.00	91.5	96,210.00	91.5	100.0	Otra concluida.
			MEDIO AMBIENTE			2,495,234		2,308,397	613,503.00	26.6	732,622.00	29.4		
71.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,975,492		1,863,886	207,562.00	11.2	327,071.00	17.4	8.6	Proyecto paralizado, se ha generado un documento para resolver el contrato.
72.	182489	143782	Ampliación de la Tubería de Drenaje del Nivel Freatico en el A.H. Tivihza - Callao	GRC-GRNMA	Callao	465,842		296,523	270,329.00	91.2	270,329.00	58.0	-	Obra en ejecución
73.	189910	146608	Creación de Barrera de Contención en el A.H. Canasta, Provincia del Callao	GRC-GRNMA	Callao	149,900		147,988	135,222.00	91.4	135,222.00	90.2	-	Obra en ejecución
			TRANSPORTE			6,062,831		70,508,798	60,895,335.00	86.4	141,234,149.58	23.2		
74.	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRC-GRI	Callao	2,083,126		425,429	425,427.00	100.0	1,882,472.00	90.4	100.0	Obra concluida en liquidación.
75.	17660	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710		1,537,539	1,422,776.00	92.5	1,449,026.00	70.5	100.0	Obra concluida y liquidada.
76.	20680	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600		581,737	-	-	58,339.58	1.5	-	En proceso de convocatoria.
77. (**)	28388	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912		-	-	-	976.00	0.0	-	Expediente Técnico concluido.
78.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	536,515,665		35,979,665	35,802,216.00	99.5	114,598,419.00	21.4	-	Contrato firmado el 20 de agosto en ejecución. Elaboración de Expediente Técnico por el Consorcio Nueva Gambetta Contrato N° 022-2010-GRC y supervisión contrato N° 028-2010-GRC
79.	34414	039221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	642,475		570,233	570,233.00	100.0	570,233.00	88.8	100.0	Obra concluida en liquidación.
80. (*)	131660	037487	Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	1,147,579		1,024,257	1,024,257.00	100.0	1,024,257.00	89.3	100.0	Obra concluida, en liquidación.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 064. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNIP	Cód. DNDP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
81.	22386	025604	Pavimentación de Pistas y veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas	GRC-GRI	Callao	3,930,278		3,221,035	3,203,170.00	99.4	3,203,170.00	81.5	51.0	Obra en ejecución.
82.	22681	025906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	GRC-GRI	Callao	2,246,591		2,246,592	2,239,950.00	99.7	2,239,950.00	99.7	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción para Liquidación.
83.	135749	109047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Límite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,045		931,284	872,223.00	93.7	872,223.00	103.8	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción para Liquidación.
84.	135811	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	451,913		489,976	489,974.00	100.0	489,974.00	108.4	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción para Liquidación.
85.	135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	464,235		506,709	506,708.00	100.0	506,708.00	109.1	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción para Liquidación.
86.	143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tíwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,384,306		2,749,717	2,672,185.00	97.2	2,672,185.00	79.0	94.9	Obra en ejecución.
87.	20377	023163	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3 - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	649,103		636,901	636,899.00	100.0	636,899.00	98.1	100.0	Obra concluida y recepción para Liquidación.
88.	17684	139823	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	8,208,010		7,599,727	7,021,324.00	92.4	7,021,324.00	85.5	81.6	Obra en ejecución.
89.	26645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil Jr. Viru, La Peña, Callao	GRC-GRI	La Peña	31,111,630		8,000,000	-	-	-	-	-	Decreto de Urgencia N° 058. Expediente por elaborar.
90.	20288	023162	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,970,301		1,923,420	1,923,419.00	100.0	1,923,419.00	48.4	67.0	Obra en ejecución.
91.	182087	145204	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,187,880		493,379	493,379.00	100.0	493,379.00	41.5	60.0	Obra en ejecución.
92.	183070	143796	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,824,263		1,591,198	1,591,196.00	100.0	1,591,196.00	33.0	45.0	Obra en ejecución.
93.	85289	090445	DESARROLLO URBANO			9,119,137		4,525,088	4,441,929.00	98.2	4,441,929.00	53.6		
94.	140551	116730	Construcción de muro de contención y gradenes en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266		416,860	416,782.00	100.0	416,782.00	33.3	25.0	El contratista ha acumulado la penalidad maxime por atraso.
95.	140389	116729	Construcción de muro de contención y gradenes en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	111,130		9,851	9,800.00	99.5	9,800.00	58.4	100.0	Obra culminada, 25-03-2011.
96.	116728	116728	Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	143,367		33,261	13,250.00	54.9	70,673.00	49.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011
97.	116726	116726	Construcción de Parque y Losa deportiva en la MZ P.44 en la Calle E-27 A, en el sector E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	228,739		17,240	17,040.00	98.8	116,166.00	50.8	25.0	Obra esta paralizada.
98.	116727	116727	Construcción de muro de contención en la asociación de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ V/B, VIC. VII, VIE - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	162,783		38,751	34,838.00	88.9	88,319.00	54.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN
							PRESUPUESTO INICIAL /1/	PRESUPUESTO MODIFICADO /1/	EJECUCION PRESUPUESTAL /1/	AVANCE FIN. %				
98.	140467	16726	Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria Etapa - Callao	GRC-GRI	Callao	133,745		10,756	10,190.00	94.7	89,311.00	66.8	100.0	Obra culminada. 30-03-2011
99.	167762	131706	Construcción de Parque Fraternalidad AA.HH. Sarita Colonia, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	318,085		328,331	328,329.00	100.0	328,329.00	103.2	100.0	Obra en ejecución.
100.	166660	131707	Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH. Marquex, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	297,208		279,482	279,482.00	100.0	279,482.00	94.0	100.0	Obra concluida. Recepcionada el 15-04-2011
101.	162772	143796	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y 2 en el A.H. Corazon de Jesus, Ventanilla, Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	131,538		131,539	131,538.00	100.0	131,538.00	96.2	100.0	Obra concluida
102.	162700	143886	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y Pasaje Plura en el A.H. San Pablo, Ventanilla, Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	166,232		157,982	157,982.00	100.0	157,982.00	96.8	100.0	Obra concluida
103.	177662	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	GRC-GRI	Callao	2,575,497		1,805,977	1,801,800.00	99.8	1,801,800.00	99.2	-	Obra en ejecución.
104.	162688	143885	Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de Licencias de Construir en el GRC, Bellavista, Callao	GRC-GRTC	Bellavista	1,081,412		1,158,658	1,109,898.00	95.8	1,109,898.00	99.2	100.0	Obra concluida
105.	165026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Kenji Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	137,160		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
106.	167049	146610	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle 5/m, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	160,465		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
107.	167048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	161,601		10,500	-	-	-	99.2		Obra concluida
108.	166040	145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	159,935		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
109.	166078	146961	Creación de Escaleras en el Paj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	165,864		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
110.	166038	147117	Creación de Escaleras en la Calle 4 y Prolongación Calle 1 del A.H. Ampliación Corazon de Jesus, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	169,830		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
111.	166081	147118	Creación de Escaleras en el Paj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Alameda, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	166,345		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
112.	166083	147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marietta Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	168,332		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
113.	166030	147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C, Las Brisas, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	179,448		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
114.	166082	147201	Creación de Escaleras en el Paj. 1 y Paj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	191,470		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
115.	166087	146963	Creación de Escaleras en las calles 2, 3 y 4, del A.H. Ampliación Hilos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	192,920		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
116.	166085	147081	Creación de Escaleras en los Paj. s/n, entre las mzs. ZH-Y2 y XZ-Y3, del A.H. Keiko Sofia Fujimori - I Etapa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	168,083		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
117.	166089	146962	Creación de Escaleras en los Paj. 3, 5 y 6, del P. J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	181,621		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	99.2		Obra concluida
118.	65406	065904	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,176,114		585,796	3,219,318.00	-	3,219,318.00	30.7	1.5	Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.
		063980	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,840,464		-	-	-	-	-	-	Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.
		131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao.	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,635,222		3,341,666	3,219,318.00	96.3	3,219,318.00	88.6	100.0	Proyecto ejecutado
			PESCA	GRC-ODNDC	Multidistrital	721,600		671,019	671,018.00	100.0	671,018.00	105.5		
		132602	Ampliación del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao.	GRC-GRDE	Callao	721,000		671,019	671,019.00	100.0	671,019.00	98.8	100.0	Proyecto ejecutado



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVE(08) SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
			TURISMO			9,705,453		51,000			48,424,00	0.5		
122.	2/1247	027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518	-	51,000	-	-	48,424,00	0.8	-	Proyecto en ejecución
123.	57502	056885	Creación de un Centro de Innovación Tecnológico de Artesanía y Turismo en el Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935	-	-	-	-	-	-	-	Convenio con MINCETUR en trámite. Expediente en elaboración.
			ESTUDIOS DE PREINVERSION											
124.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	n.a.	19,072,339	668,134	688,133.00	100.0	913,043.00	-	-	
							19,072,339	668,134	688,133.00	100.0	913,043.00	-	-	
			TOTAL			792,856,030	66,396,763	154,157,219	111,659,970.00	72.4	266,576,874.67	33.6		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE 'CONSULTA AMIGABLE' DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORIAS AL 30 DE DICIEMBRE.

(*) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(***) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(****) Considerada en el D.U. 054-2011

(A) Estado del PIP. Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprob), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

