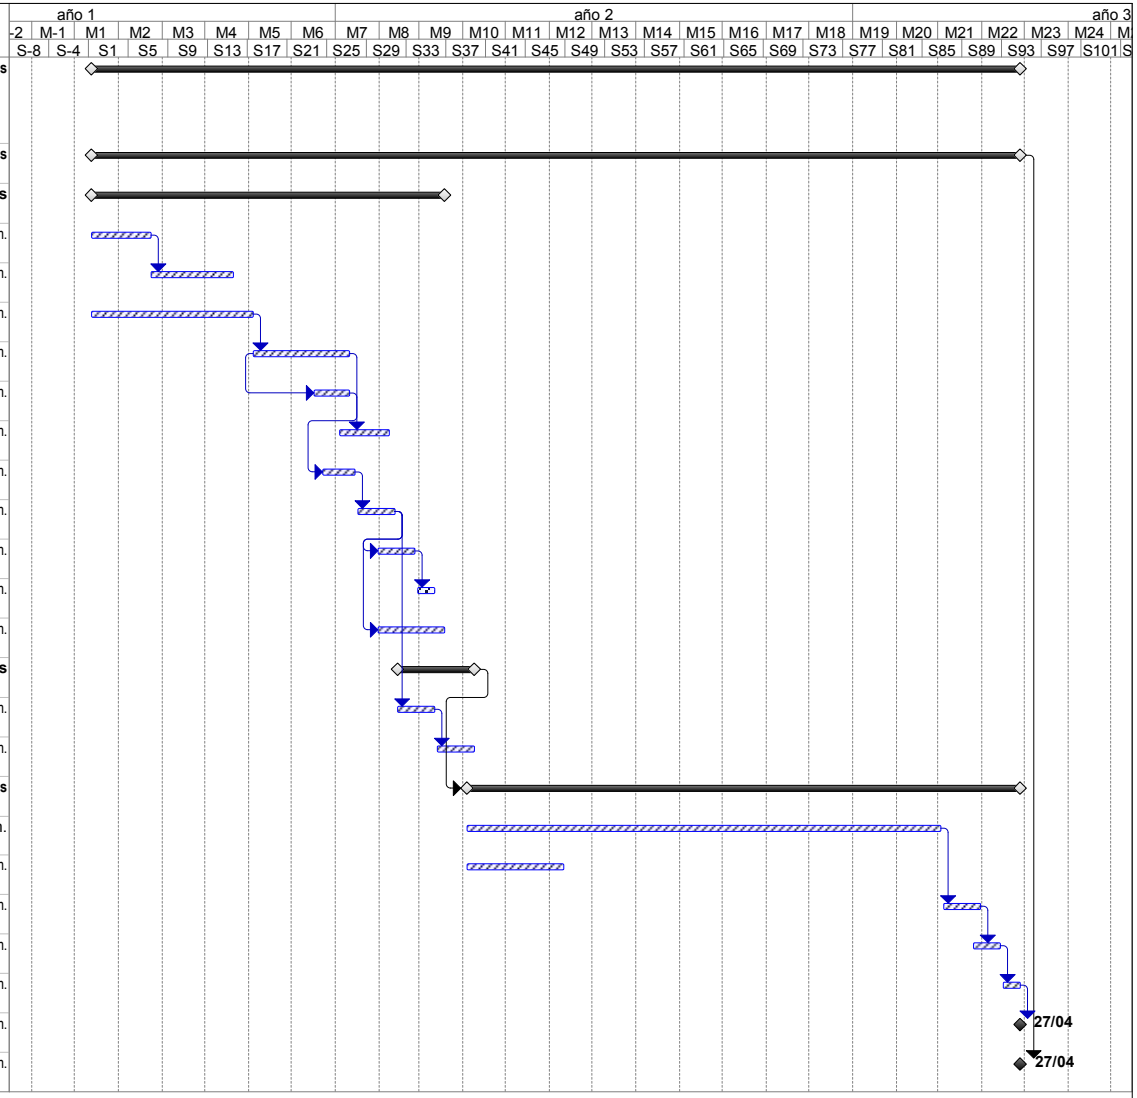Id	Nombre de tarea	Duración
1	**Elaboración y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para instalación de 3era esfera en PPAL**	**23.2 mss**
2	**INICIO**	**23.2 mss**
3	**INGENIERIA**	**8.7 mss**
4	ESTUDIO CONCEPTUAL - PERFIL INVERSION	6 sem.
5	ESTUDIO DE RIESGOS PRELIMINAR	8 sem.
6	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	16 sem.
7	APROBACION DGAAE	9 sem.
8	BASES DE LICITACION SUPERVISION & EPC	3 sem.
9	ESTUDIO DE SUELOS	5 sem.
10	CONCURSO DE PROYECTO EPC	3 sem.
11	INGENIERIA BASICA	4 sem.
12	ESTUDIO DE RIESGO - HAZOP	4 sem.
13	PLAN DE CONTINGENCIA	2 sem.
14	INGENIERIA DE DETALLE	7 sem.
15	**GESTIONES OSINERGMIN**	**2 mss**
16	**OSINERGMIN PRIMERA FASE - ITF DISENO OBRAS**	4 sem.
17	**APROBACION OSINERGMIN - ITF DISENO OBRAS**	4 sem.
18	**CONSTRUCCION**	**14 mss**
19	CONSTRUCCIONES	48 sem.
20	ADECUACION INSTALACIONES EXISTENTES	10 sem.
21	PRUEBAS	4 sem.
22	EXPEDIENTE FINAL ITF OPERACION	3 sem.
23	APROBACION OSINERGMIN - ITF FINAL	2 sem.
24	PUESTA EN SERVICIO	0 sem.
25	**FIN**	0 sem.
